

# 安全に関する改善提案

記入日: 17年 10月 24日

(所属会社)

(氏名)

(連絡先電話番号)

記入者:

設計・施工区分	工種	想定される事故の種類	想定される事故の要因	危険作業の種類
設計	監査廊工・基礎処理	墜落・飛来落下	人的・設備	通行・運搬

**改善の概要:**

現状では監査廊内の運搬は人力によるかウインチによる引き上げしかない。また、作業床を確保すると通路が確保できない。(法的に問題) 監査廊断面を大きくし天井に荷役設備をつけることにより監査廊内における作業の安全が確保できる。


**メリット:**

監査廊内の作業床と作業通路が確保でき、監査廊内の運搬作業が安全になる。

**デメリット:**

コストがかかる(断面を大きくする場合のコストは鉄筋費のみでコンクリートは少なくなる。荷役設備は今まで計上していないことがおかしい。

**改善前 (略図または写真)**

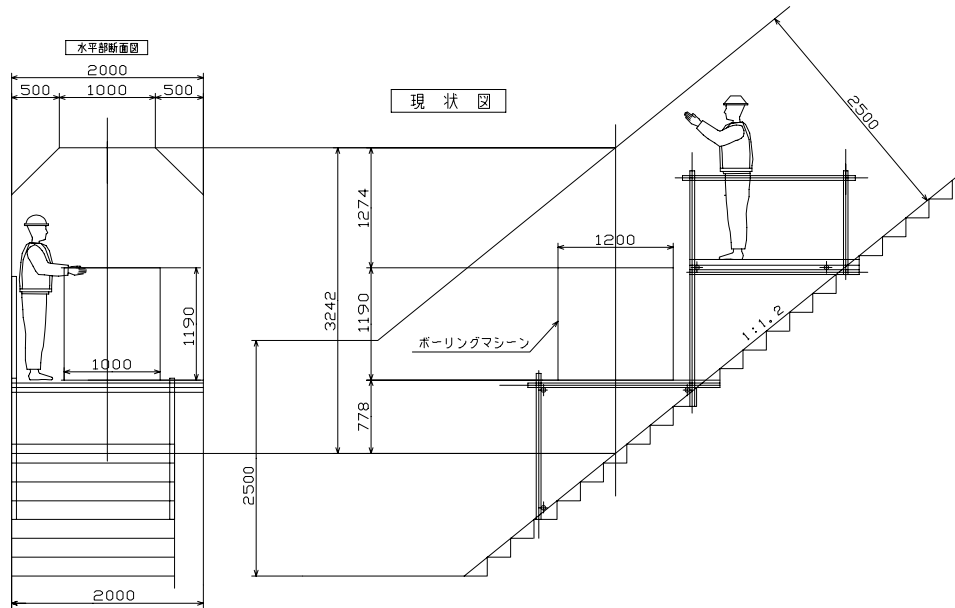

**改善後 (略図または写真)**

